รายละเอียดการส่งงานและการนำเสนอ Term Project งานกลุ่มครั้งที่ 1

เก็บคะแนนกลุ่ม 12 คะแนน

(ใช้เวลาไม่เกิน 25 นาที รวมถามตอบ)

โดย ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช และพี่ TA

สารบัญ

การนำเสนองานกลุ่ม	3
กำหนดการส่งและนำเสนองานกลุ่ม	4
สิ่งที่ต้องส่ง	5
รายละเอียดการนำเสนอและเกณฑ์การให้คะแนน	7
การพิจารณา Trello	8
ตัวอย่าง	9

การนำเสนองานกลุ่ม

- การจัดทำ Requirement Spec โดย เขียน User Story และ Use Case
- ออกแบบ UI Prototype
- ออกแบบ Web App
- เขียน Code เพื่อสร้าง Web App พร้อม Build ให้สามารถ Run ใน Docker Containers
- การจัดทำ Sprint Planning
- การจัดทำ Sprint Demo
- Requirements, User Stories, Product Backlog, Sprint 0 Complete, Sprint Planning

กำหนดการส่งและนำเสนองานกลุ่ม

ส่งผลงาน**เข้ากล่องใน Moodle** ภายใน**วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ก่อนเวลา 23.00 น.**

ต้องนำเสนอ Present Sprint Planning และ Present Sprint Demo กับอาจารย์และพี่ TA

(**หมายเหตุ ตารางกำหนดการนำเสนอ ประกาศภายหลัง**)

- ภาคพิเศษ นำเสนอ วันอังคารที่ 20 ต.ค. เวลา เวลา 16.30 – 19.30 น. ที่ ห้อง บร.2-107
- ภาคปกติ นำเสนอ วันพุธที่ 21 ต.ค. เวลา 15.00 -19.30 น. ที่ ห้อง บร.2-107

***** ขอสงวนสิทธิในการปรับกระบวนการนำเสนอเพื่อความเหมาะสม และทุกกลุ่มต้องพร้อมในการนำเสนอ โดยพี่พัชจะสุ่มกลุ่มที่นำเสนอในวันที่นำเสนอ*****

สิ่งที่ต้องส่ง

1. ไฟล์ PDF ที่มีชื่อไฟล์ว่า **“links_กลุ่มX_ภาคปกติ.pdf”, “links_กลุ่มX_ภาคพิเศษ.pdf”** เมื่อ X แทนหมายเลขกลุ่ม ที่ระบุ:
    - Link Trello Boards
    - link github ของกลุ่ม
2. Trello Boards ประกอบด้วย **2 Boards**

    2.1 Board แสดงผลการทำ Requirement Management ที่แสดง
    - Problems
    - Needs
    - Constraints
    - Stakeholders
    - Features
    - Use cases
    - Product Backlog (User stories) ที่คิดมาจาก use cases ของทั้งระบบ

2.2 Board ที่แสดงรายละเอียด Release Planning สำหรับ MVP 1 ที่แสดง

- **Sprint backlog** ใน **Sprint1** เป็น User stories ที่กลุ่มพิจารณาเลือกมา develop เป็น system ใน Sprint 1 มี Detail of User Stories ครบถ้วนอย่างน้อยเท่า**อย่างน้อย 3-5 User Stories** ตามลำดับความสำคัญของปัญหา ให้สามารถนำมาทำเป็น Software ได้เสร็จใน 2 สัปดาห์ของ Sprint 1
- **Sprint backlog** ใน **Sprint 2** เป็น User stories ที่กลุ่มพิจารณาเลือกมา develop เป็น system ใน Sprint 2 หลังจบ Sprint 1 **อย่างน้อย 3-5 User Stories** อาจจะมีงานหรือ user stories ค้างจาก Sprint 1
- **To Do** ให้ระบุ Tasks ที่ต้องทำเพื่อ develop system ให้ทำ User stories ที่เลือกมาทำใน Sprint
- **Doing** สมาชิกในทีมลาก Tasks จาก To Do ที่ตัวเองเลือกทำ
- **Done** สมาชิกที่ทำ Doing ลาก Tasks ของตัวเองเมื่อทำงานเสร็จ

รายละเอียดของ Sprint Planning จำนวน 2 รอบ (Sprint Planning in details ที่มี Tasks จำนวน 1 Sprint และ Sprint Backlog สำหรับ Sprint ที่ 2) พร้อมรายละเอียดดังนี้

- ใน Product Backlog ให้นักศึกษาแตก Use cases ที่ทีมเลือกมาแตกเป็น user stories สำหรับ Sprintที่ 1 และ 2 ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตาม User Story Template
- ใน Tasks ให้แสดง Tasks ขั้นตอนการ Develop ระบบให้ทำงานได้ตาม User Stories ที่ทีมเลือกเป็นเป้าหมายของการ Development ของ Sprint 1 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดย**จัดลำดับก่อนหลัง**ของ User Stories **ให้เหมาะสม** ตรวจสอบความครบถ้วนของ Tasks ต้องครบตามกระบวนการ SDLC (Software Development Life Cycle) และยึดตาม Scrum Process (ตัวอย่างหน้า 11)

รายละเอียดการนำเสนอและเกณฑ์การให้คะแนน(คิดเป็นส่วนละ 100%)

ส่วนที่ 1: Present Release Planning และ Sprint Planning (7 คะแนน)

1. ความครบถ้วนของ Tasks งานย่อยของ User Story ต้องครบตามกระบวนการ SDLC (Software Development Life Cycle) และ ยึดตาม Scrum Process (25%)
2. ความครบถ้วนของ User Stories ที่กำหนดใน Product Backlog คุณภาพการเขียน User stories Detail ได้คิดวิเคราะห์ User Stories มาครบที่จะแก้ปัญหาของ Project ได้ เนื้อหารายละเอียดของ User Stories ใน Sprint 1 ครบถ้วนตาม Template และ มี Definition of Done (Test cases) ที่คิดวิเคราะห์มาดีแล้ว (20%)
3. คุณภาพการจัดทำเนื้อหาบน Trello แสดงการวิเคราะห์ Requirements ที่ทำมาอย่างดี แสดง Sprint Planning (Tasks of Sprint1), Sprint Backlog, Release Planning ในรูปแบบการ์ดใน Trello ที่เรียบร้อย สวยงาม อ่านง่าย มองเห็นภาพรวมโครงการได้อย่างชัดเจน เนื้อหาของ Release Plan และ Sprint Plan ครบถ้วน (15%)
4. คุณภาพการนำเสนอ พิจารณาจากการรักษาเวลา รูปแบบการนำเสนอ วิธีการนำเสนอ และคุณภาพเนื้อหาที่นำเสนอครบถ้วน เข้าใจได้ดี (20%)

- การนำเสนอ ทีมสามารถวางแผนการนำเสนอในรูปแบบทีมได้ คือ **ไม่จำเป็นต้องนำเสนอทุกคน แต่ต้องมาทุกคน**
- ให้นำเสนอผ่านการแสดงงานที่ทำบน Trello และ แสดงผลงานจากที่เก็บใน Git และ ที่สามารถรันได้จริงบน Docker Containers
- เนื้อหาที่ต้องนำเสนอ ประกอบด้วย:
  - นำเสนอ User Stories ที่เลือกมาทำ Sprint 1 โดยจัดลำดับก่อนหลังของ User stories และ มี Detail of User Stories ครบถ้วนอย่างน้อยเท่า**อย่างน้อย 3-5 User Stories** ตามลำดับความสำคัญของปัญหา ให้สามารถนำมาทำเป็น Software ได้เสร็จใน 2 สัปดาห์ของ Sprint 1
  - นำเสนอ Tasks ใน To Do สำหรับ Sprint 1 โดยจัดลำดับก่อนหลังของ Tasks
  - นำเสนอความพร้อมของสภาพแวดล้อมสำหรับพัฒนา Software (Environment for Software Development) ของทีม ว่า ได้มีการกำหนด เลือก เตรียมเครื่องมืออะไรบ้างสำหรับการพัฒนา Web Application ใน Project

5. ความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถผลักดันให้งานของทีมสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผน เสร็จงานตามกำหนดเวลา โดยดูจากร่องรอยการย้าย Tasks บน Trello (10%)
6. ความสวยงามของ UI Prototype คุณภาพการออกแบบหน้าจอ UI Prototype ว่าตรงตาม Concepts ที่ระบุใน User Story Detail ครบสำหรับ Sprint 1 (10%)

ส่วนที่ 2: Present Sprint Demo และ Sprit Retrospective (5 คะแนน)


1. นำ code ที่ push ไปเก็บ Git Repository มีการจัดเก็บโค้ดเป็นเวอร์ชั่น และ สามารถ checkout code นำมา Build เป็น System ที่สามารถรันบน Docker Containers บนเครื่องในห้อง Lab ที่จะ demo ได้ หมายเหตุ ดูร่องรอยการ Push Code บน Git (30%)
2. สามาถทำ Sprint demo ที่แสดงให้เห็นว่าระบบทำได้ตาม user stories ที่กำหนดใน sprint1 ครบถ้วนหรือไม่ แสดงให้เห็นว่า System implement ตาม UI prototype ที่ออกแบบไว้ (30%)
3. **Sprint Retrospective** สามารถนำเสนอให้เห็นว่ามีการช่วยกันประชุมเพื่อเลือก Tasks มาทำจนทำเสร็จ สามารถสรุปงานที่ทำไม่เสร็จ งานที่ค้างหลังจบ Sprint 1 มีการให้ทุกคนในทีมช่วยกันมองย้อนกลับไป ตั้งแต่เริ่ม-จนกระทั่งจบ Sprint1 ทีมได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองปัญหาที่ทีมพบใน Sprint 1 และ สามารถสรุปวิธีทำงานที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น สรุปเป็นมติของทีม สามารถเล่ากระบวนการทำงานที่ทีมจะใช้ในการทำงานใน Sprint 2 ให้เห็นภาพได้ (30%)
4. **Sprint2 Planning** ใน Sprint2 พิจารณาว่าจะมีการปรับ Sprint goals ของ Sprint2 หรือไม่ (ได้แก่ ปรับ user stories ปรับเป้าหมายไปแก้ bugs เป็นต้น) และ หากปรับจะปรับเป็นอย่างไร (10%)

ใช้เวลาไม่เกิน 25 นาที รวมถามตอบ


การพิจารณา Trello


- โดยจะตรวจสอบจากร่องรอยการเลื่อนการ์ดของสมาชิกรายบุคคลในช่วงที่ทำ Project ร่วมกัน
- การให้คะแนนกลุ่มด้วยความพร้อมของข้อมูล การทำงานที่**สม่ำเสมอ**และเสร็จสมบูรณ์ (เฉพาะใน Trello)


ตัวอย่าง Trello Board: Requirement

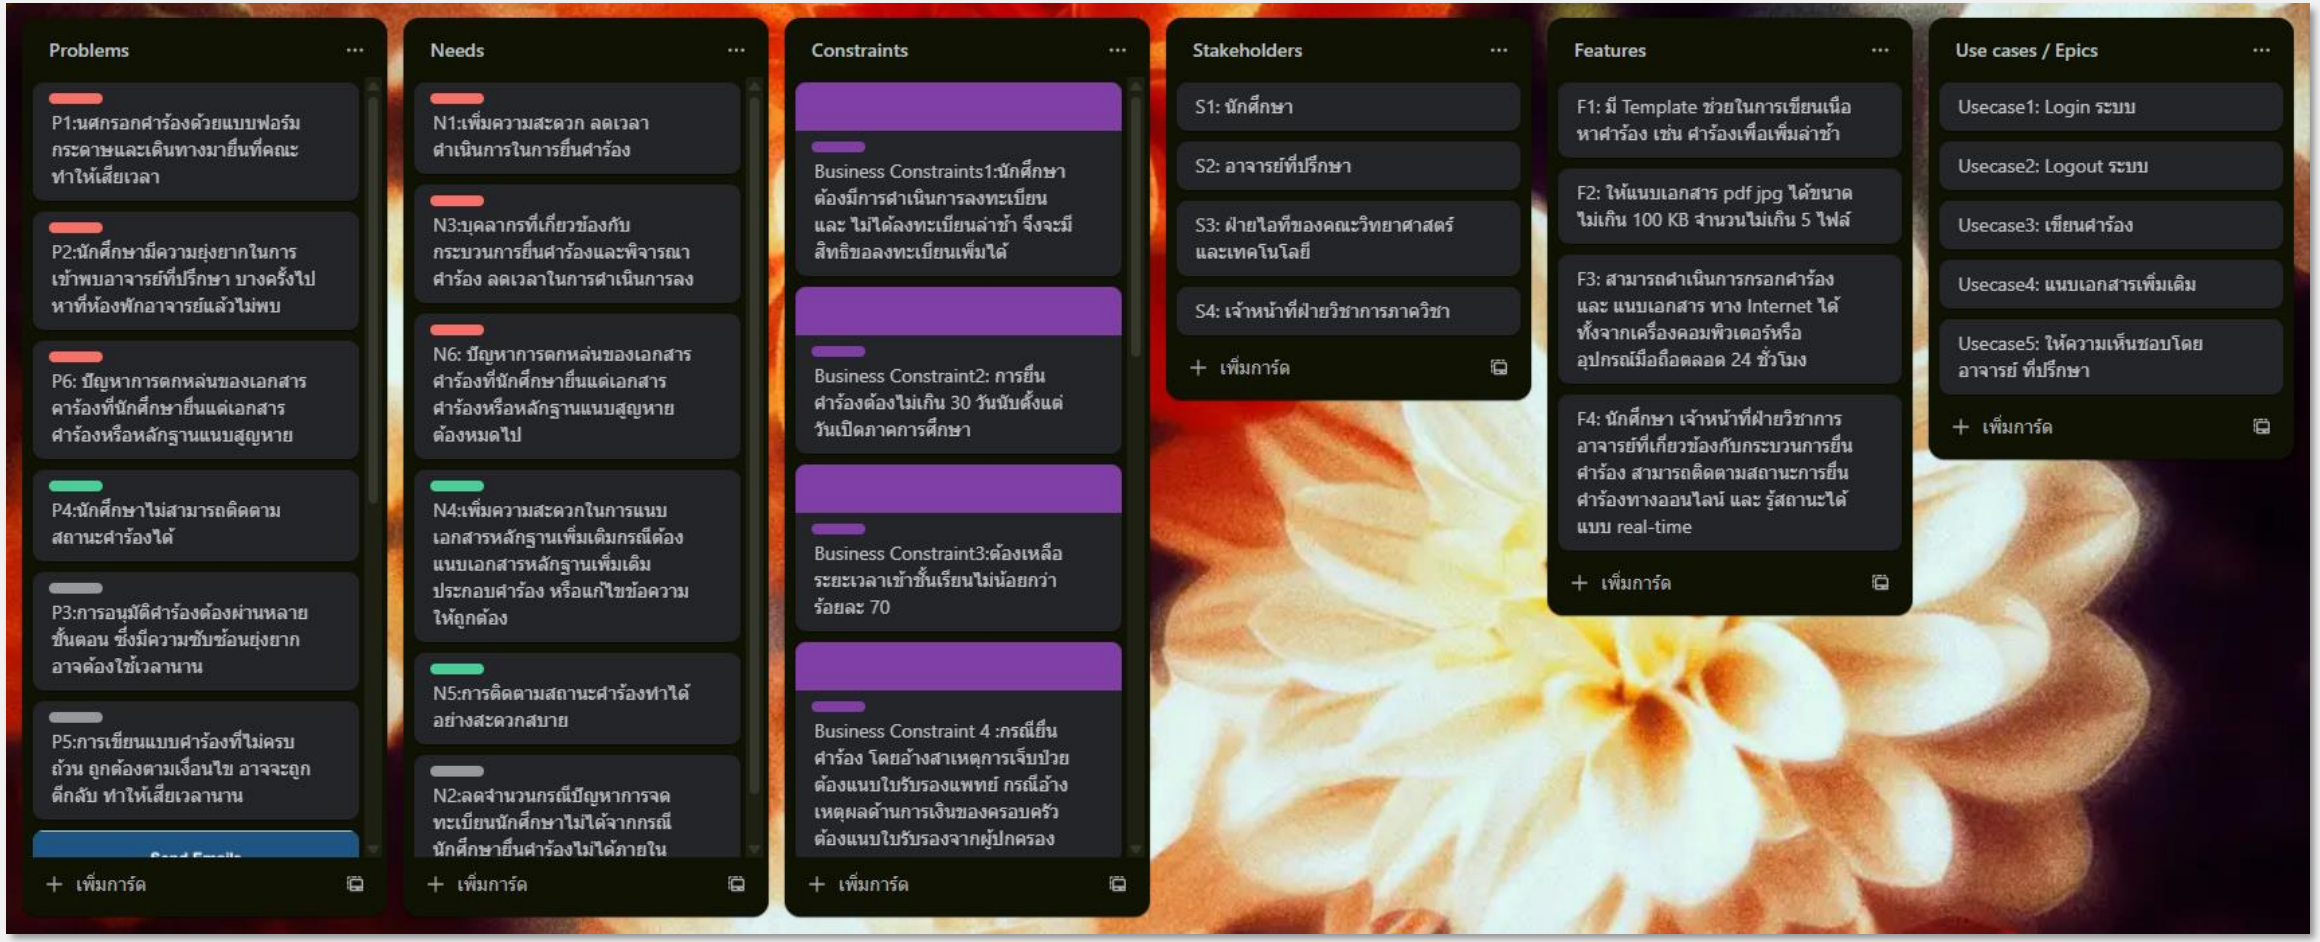

ตัวอย่าง Trello Board: Sprint Planning

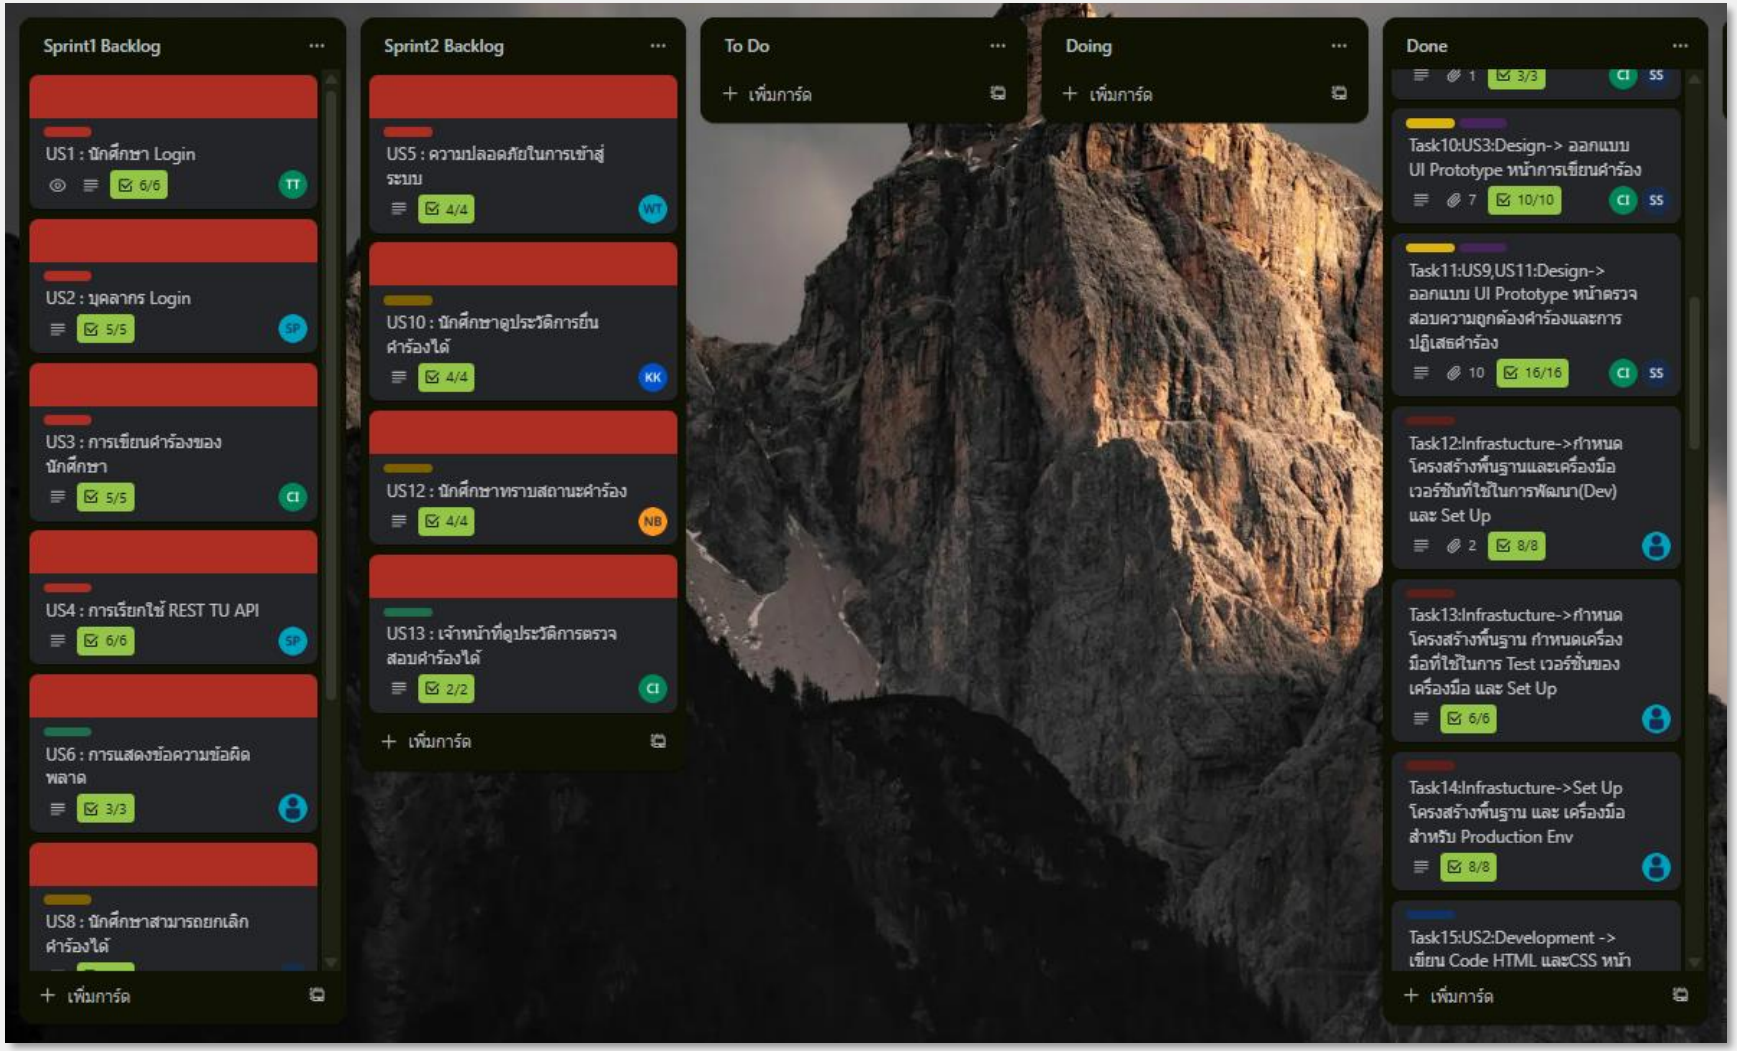

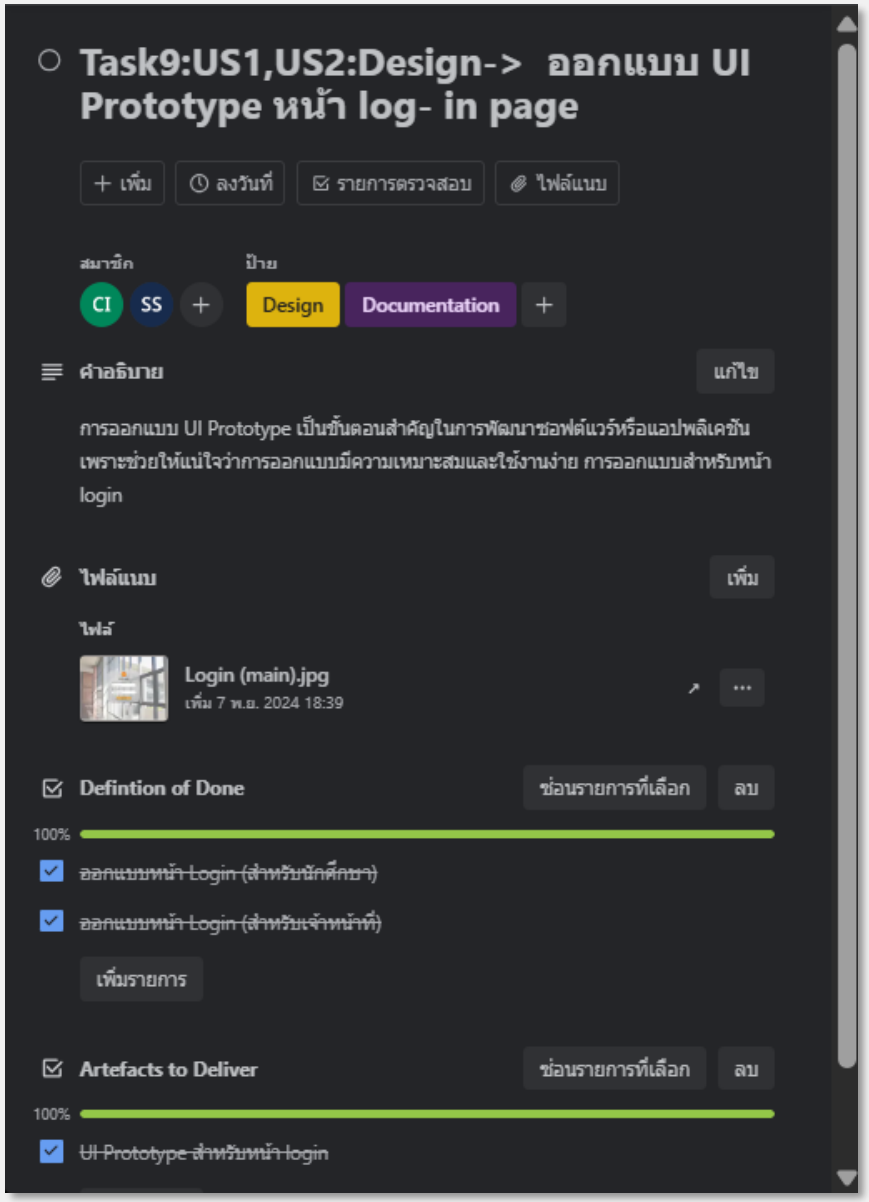

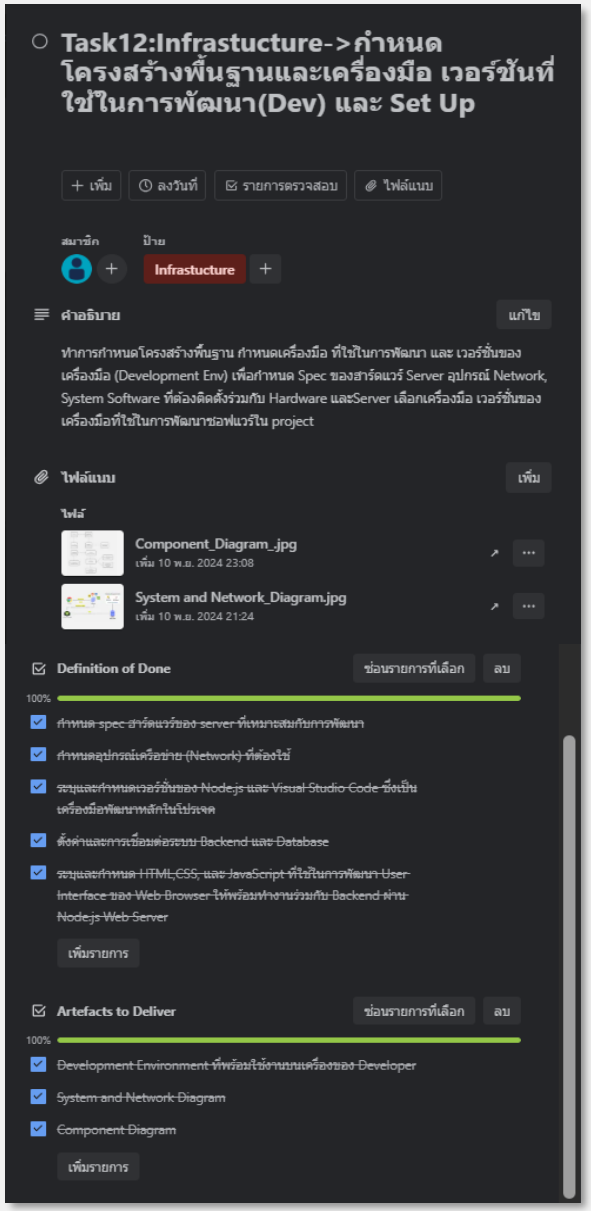

ตัวอย่าง Task

<u>เมื่อสร้างการ์ด ใน List ให้กำหนดรายเอียดดังนี้</u>

1. ชื่องาน ประกอบด้วยหมายเลข Task : สำหรับ User story ไหน : กลุ่มงานใดตามมาตรฐาน ISO -> ชื่องานสะท้อน task
2. ใส่รายละเอียดของงาน (Description)
3. แนบไฟล์ภาพหรือไฟล์ข้อมูลต่างๆ พื่อใช้ในการทำ Task ซึ่งไฟล์นั้นอาจอยู่ในเครื่อง หรือบน Google Drive หรือใน Dropbox (ถ้ามี)
4. รายการงานที่ต้องทำย่อยๆ (Check List) พร้อมความคืบหน้า
5. รายการ Products ที่ต้องจัดทำ ส่งเมื่อ Task เสร็จ
6. กำหนดป้าย (Label) เพื่อจัดหมวดหมู่ของ Tasks ด้วยชื่อและสี
7. กำหนดสมาชิกที่จะเข้ามาทำงาน (optional)
8. กำหนด Due Date เพื่อกำหนดวันที่ต้องการให้งานเสร็จ
